

114 年度改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫  
執行成果報告書

國立南投高級商業職業學校

「弘道大樓二樓禮堂天花板改善工程」

# 114 年度改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫

## 執行成果報告書

### 壹、核定經費一覽表

單位：元

學校名稱	國立南投高級商業職業學校		所屬縣(市)	南投縣
補助計畫	子計畫名稱	核定經費	實際請領經費	
1	弘道大樓二樓天花板改善工程	5,600,000	3,717,215	
	(上列表格不足請自行增列)			
<b>經費總計：3,717,215 元</b>				
承辦人	姓名：胡富凱		E-mail： fkhu@mails.pntcv.ntct.edu.tw	
	聯絡電話：0492222269#1101		傳真：0492227038	


### 貳、總計畫說明

未改善前說明	本校弘道大樓啟用迄今已近 30 年，活動中心天花板長年因老舊或地震 損傷，偶有掉落事件，對師生安全有危害之虞。學校陸續局部修繕過 數次，但近兩年地震頻繁，天花板有二十多處已毀損掉落，為維護全 體師生活動安全，擬申請本計畫補助經費做全面修繕，將原有礦纖天 花板拆除後，更換為耐燃一級明架矽酸鈣天花板，使用上更穩固安 全，提供學生更優良的學習活動環境！
計畫目標	弘道大樓二樓天花板更換後，提供師生更美觀安全的活動場所！
達成效益	1. 天花板更新同時，消防設備一併檢修更換，提供師生安全無虞的活動場所！ 2. 舉辦校內外各項活動，或協助縣府辦理頒獎典禮，均有寬闊美觀的場所！


## 參、各子計畫執行成果

### [一]、(子計畫名稱)


子計畫名稱	弘道大樓二樓天花板改善工程		
執行單位	總務處		
核定經費：5,600,000	實際支用經費：4,956,287 (學校自籌25%)		
決標日期	114年6月4日	施工單位：幸興工程行	
完工日期	114年9月14日	設計監造單位：鼎漢建築師事務所	
施工期程	114年6月17日至114年9月14日		
執行進度	<input type="checkbox"/> 提前完成	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 落後____個月

改善前	
改善前	

改善中

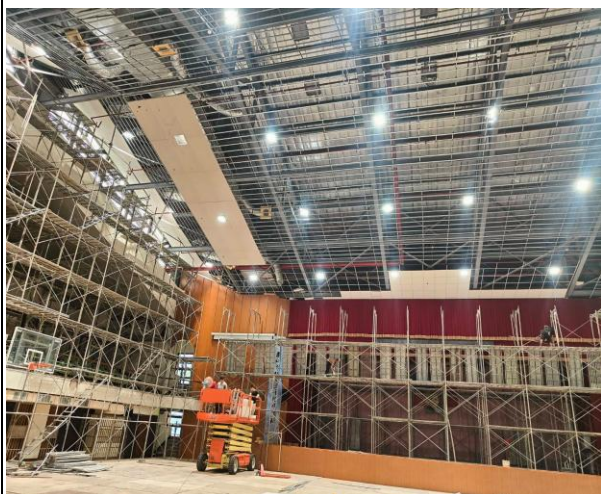

改善中

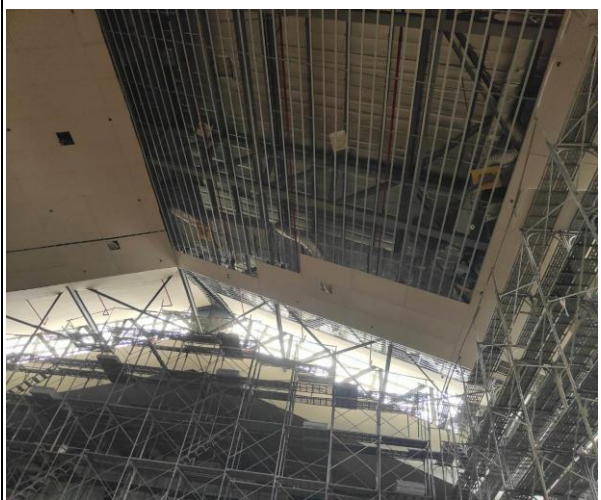

改善後



改善後

