

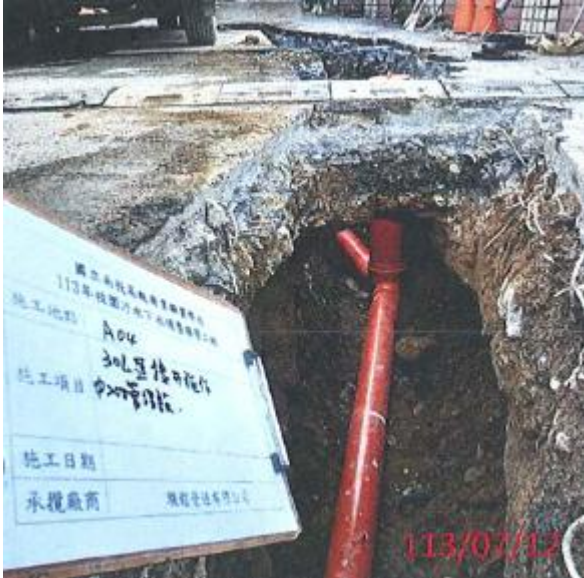


子計畫名稱	校園汙下水道暨接管工程		
執行單位	總務處		
核定經費：8,000,000 元	實際支用經費：8,000,000 元		
決標日期	113 年 06 月 12 日	施工單位：駿鎧營造有限公司	
完工日期	113 年 10 月 15 日	設計監造單位：桔源工程顧問有限公司	
施工期程	113 年 06 月 21 日至 113 年 10 月 15 日		
執行進度	<input checked="" type="checkbox"/> 提前完成	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 落後 個月

改善前		<p>概要說明：警衛室污水出口處，用集污井收集污水並接管排至南投市既有污水管網，並修復道路</p>
改善前		<p>概要說明：明遠樓污水排放設置連接管排至南投市既有污水管網。</p>

<p>改善前</p>		<p>概要說明：道慈樓化糞池抽乾、消毒、填平，用集污井收集污水並接管排至南投市既有污水管網。</p>
<p>改善前</p>		<p>概要說明：惠中樓化糞池抽乾、消毒、填平，用集污井收集污水並接管排至南投市既有污水管網。</p>
<p>改善前</p>		<p>概要說明：弘道樓化糞池抽乾、消毒、填平，用集污井收集污水並接管排至南投市既有污水管網。</p>

<p>改善前</p>		<p>概要說明：德新樓污水出口處，用集污井收集污水並接管排至南投市既有污水管網。</p>
<p>改善前</p>		<p>概要說明：敬業樓化糞池抽乾、消毒、填平，用集污井收集污水並接管排至南投市既有污水管網。</p>
<p>改善中</p>		<p>施工挖掘覆蓋鐵板</p>

<p>改善中</p>		<p>慧中樓化糞池打除</p>
<p>改善中</p>		<p>弘道大樓化糞池打除</p>
<p>改善中</p>		<p>汗水管理設</p>

<p>改善中</p>		<p>CLSM 澆置</p>
<p>改善後</p>		<p>面層修復</p>
<p>改善後</p>		<p>室內吊管</p>

改善後



AC 面層鋪設

改善後



標線回復

改善後



面層鋪設
