

113 年度改善與充實特教資源、設施設備與無障礙校園環境改善計畫
執行成果報告書

國立南投高級商業職業學校

「敬業樓無障礙坡道及出入口改善工程」

「綜合職能科實習場域暨停車場建置工程」

「綜合職能科實習課程設備採購」

113 年度改善與充實特教資源、設施設備與無障礙校園環境改善計畫

執行成果報告書

壹、核定經費一覽表

單位：元

學校名稱	國立南投高級商業職業學校		所屬縣(市)	南投縣
補助計畫	子計畫名稱	核定經費	實際請領經費	
1	敬業樓無障礙坡道及出入口改善。	1,300,000 元	1,300,000 元	
2	綜合職能科實習場域(車輛清潔服務)設置	2,275,000 元	2,275,000 元	
3	綜合職能科實習課程(食物製備)設備採購	425,000 元	425,000 元	
	(上列表格不足請自行增列)			
經費總計：4,000,000 元				
承辦人	姓名： 胡富凱	E-mail： fkhu@mails.pntcv.ntct.edu.tw		
	聯絡電話：049-2222269-1101	傳真：049-2227038		

貳、總計畫說明


未改善前說明	1. 敬業樓原有無障礙坡道不符法規且過於迂迴造成一般同學進出不便。 2. 綜合職能科車輛清潔服務課程長年在停車場露天授課，無遮風避雨設備。
計畫目標	改善與充實本校特教資源、設施設備與無障礙校園環境改善。
達成效益	1. 敬業樓一樓建置樓梯，讓一般同學以階梯方式上下樓；身障同學改以無障礙升降機到達一樓，便利性與安全性兼顧。 2. 提供綜合職能科車輛清潔服務課程師生良好教學環境，提升學習成效。 3. 充實綜合職能科食物製備課程教學設備，提升學習成效。

參、各子計畫執行成果




[一]、敬業樓無障礙坡道及出入口改善

子計畫名稱	敬業樓無障礙坡道及出入口改善		
執行單位	總務處		
核定經費：1,300,000 元	實際支用經費：1,396,031 元(學校自籌 96,031)		
決標日期	114 年 4 月 23 日	施工單位：聖弘土木包工業	
完工日期	114 年 7 月 16 日	設計監造單位：連震岳建築師事務所	
施工期程	114 年 5 月 12 日至 114 年 7 月 20 日		
執行進度	<input checked="" type="checkbox"/> 提前完成	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 落後 個月

<p style="text-align: center;">改善前</p>		<p>敬業樓原有無障礙坡道過於迂迴使用不便</p>
<p style="text-align: center;">改善前</p>		<p>敬業樓原有階梯在側邊使用不便</p>

<p>改善中</p>		<p>拆除原有坡道</p>
<p>改善中</p>		<p>拆除原有階梯</p>
<p>改善中</p>		<p>戶外階梯四周地樑板模</p>
<p>改善中</p>		<p>戶外階梯板模</p>

<p>改善中</p>		<p>澆灌混凝土</p>
<p>改善中</p>		<p>抵石子與設置欄杆</p>
<p>改善中</p>		<p>升降平台鋪設鋼筋</p>
<p>改善中</p>		<p>設置升降平台</p>




改善後		戶外樓梯完成
改善後		垂直式升降平台完成
改善後		垂直式升降平台完成

[二]、綜合職能科實習場域(車輛清潔服務)設置

子計畫名稱	綜合職能科實習場域(車輛清潔服務)設置		
執行單位	總務處		
核定經費：2,275,000 元	實際支用經費：3,892,628 元(學校自籌 1,617,628)		
決標日期	114 年 6 月 14 日	施工單位：幸興室內裝修設計有限公司	
完工日期	114 年 9 月 23 日	設計監造單位：林玲釗建築師事務所	
施工期程	114 年 6 月 14 日至 114 年 9 月 21 日		
執行進度	<input type="checkbox"/> 提前完成	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 落後 0.5 個月

<p>改善前</p>		<p>本校校地徵收訴訟結束，強制執行點交後拆除地上物</p>
<p>改善前</p>		<p>本校校地徵收訴訟結束，強制執行點交後拆除地上物</p>
<p>改善前</p>		<p>本校校地徵收訴訟結束，強制執行點交後拆除地上物</p>
<p>改善前</p>		<p>綜合職能科車輛清潔服務課程長年在停車場露天授課，無遮風避雨設備。</p>
<p>改善前</p>		<p>綜合職能科車輛清潔服務課程長年在停車場露天授課，無遮風避雨設備。</p>

<p>改善前</p>		<p>舊有圍牆老舊且布滿管線</p>
<p>改善中</p>		<p>開挖整地</p>
<p>改善中</p>		<p>移植樹木</p>
<p>改善中</p>		<p>鋪設水電管線</p>

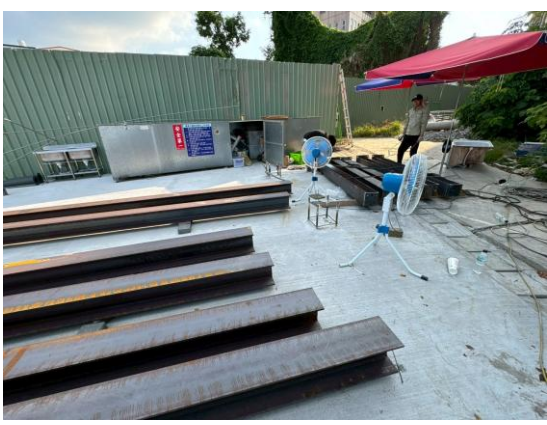


改善中		埋設排水溝及陰井
改善中		綁定鋼筋加固
改善中		混凝土澆灌後架設花台
改善中		鋪設連鎖磚
改善中		搭建洗車場支柱

<p>改善後</p>		<p>整地後一部分作為停車場用途，提供同仁及來賓更便利的空間。</p>
<p>改善後</p>		<p>建置洗車設備</p>
<p>改善後</p>		<p>搭設遮陽棚架提供師生良好教學環境，免於日曬雨淋。</p>

改善後		設置花台美化
改善後		設置洗車相關設備

[三]、綜合職能科實習課程(食物製備)設備採購

子計畫名稱	綜合職能科實習課程(食物製備)設備採購		
執行單位	總務處		
核定經費：425,000 元	實際支用經費：294,120 元(另有部分小額採購及併入其他校內標案)		
決標日期	114 年 7 月 10 日	得標廠商：元揚企業有限公司	
完工日期	114 年 8 月 5 日	設計監造單位：無	
施工期程	114 年 7 月 10 日至 114 年 8 月 9 日		
執行進度	<input checked="" type="checkbox"/> 提前完成	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 落後 個月

<p>設備</p>		<p>冰沙機兩台</p>
<p>設備</p>		<p>半自動咖啡機及義式磨豆機</p>
<p>設備</p>		<p>半自動咖啡機及義式磨豆機</p>

<p>設備</p>		<p>冰箱</p>
<p>設備</p>		<p>製冰機及開飲機</p>
